

✓ 사업구분	사+자체+타기관(LH, 수자원공사)	✓ 예산구분	예 산
✓ 사업기간	중장기	✓ 신규여부	계 속

### ❖ 사업목표(추진방향)

낙동강과 구 전체를 아우르는 생태탐방로 조성으로 낙동강의 우수한 수변경관과 다른 자연 자원과 연계를 통한 낙동강 110리 탐방로 조성

### ❖ 사업개요

- 사업명 : 낙동강 110리 둘레길 조성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업구간 : 총 길이 44.1km(110리)
- 사업내용
  - 낙동강과 구 전체를 아우르는 걷고 싶은 낙동강110리 둘레길 조성
  - 강, 습지, 철새 등 자연생태환경과 연계된 즐겁고 안전한 보행 환경 조성
  - 완료구간
    - 1코스(대저수문~명지IC, 16km) : 낙동강 제방길(벚꽃길)로 기 조성됨
    - 2코스(명지IC~명지오션시티~신호대교, 7.1km) : 갈맷길로 기 조성됨
  - 중기사업구간('25년 준공 예정)
    - 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시 근린공원(LH공사 추진)
    - 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티 수변공원1,2,3호(수자원공사 추진)
  - 장기사업구간
    - 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2km) : 제2에코델타시티, 서부산권 복합산업단지('25년 착공)
    - 6코스(김해교~대저수문, 6km) : 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역(도시관리과)

❖ **확인지표** : 3, 4코스 완공, 5, 6코스 착공

❖ **재원조달 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	356	-	356	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
구 비	356	-	356	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

❖ **세부 추진계획**

(단위 : 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
낙동강110리 둘레길 조성	총 계		356	
	2022년	-		
	2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>4코스(에코델타시티) 1구역 준공, 2구역 착공</li> <li>5코스(서부산권 복합산업단지) GB해제 추진</li> <li>5코스(제2에코델타시티) 기본계획 수립</li> <li>6코스 서낙동강 친수공간 구상 마스터플랜 수립(용역)</li> </ul>	356	6코스 용역비
	2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>3코스(명지국제신도시 근린공원) 착공</li> <li>5코스(서부산권 복합산업단지) 산업단지계획 승인</li> <li>5코스(제2에코델타시티) GB해제 추진</li> <li>6코스 서낙동강 하천변 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역 결과에 따라 둘레길 조성 추진</li> </ul>		
	2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>3코스(명지국제신도시 근린공원) 준공</li> <li>4코스(에코델타시티) 2구역 준공</li> <li>5코스(제2에코델타시티, 서부산권복합 산업단지) 착공</li> </ul>		
	2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>5코스 공사 진행</li> </ul>		
	2027년 이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>5코스(제2에코델타시티, 서부산권복합 산업단지) '28년 준공 예정</li> </ul>		

## ❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
낙동강110리 둘레길 조성						

## ❖ 추진실적

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시(LH공사)
  - 3-1, 3-2 공구 : '18. 착공, '21. 공사 잠정 중단(명지지구개발계획변경)
  - ※ 수로관련 세부계획 수립('23. 하반기) 후 공사 재개
- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티(수자원공사)
  - 1구역(수변공원 3호) : '18. 착공, '23. 3월 준공
  - 2구역(수변공원 1,2호) : '22. 계약 발주, '23. 1월 착공
- 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2km) : 부산시(수자원공사, 부산도시공사)
  - 제2에코델타시티 : '22. 개발구상 및 정책발표, '23. 기본계획 수립
  - 서부산권 복합산업단지 : '17. 사업추진 계획수립 '22. 연도별 산업단지 지정계획 승인
- 6코스(김해교~대저수문, 6km) : 도시관리과
  - 서낙동강 하천변 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역('23. 3.~'24. 3.)

## ❖ 향후 추진계획

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시(LH공사)
  - 3-1, 3-2 공구(근린공원) : '24. 상반기 공사 재개, '25. 준공 예정
  - 3-3 공구(근린공원) : '26. 착공 예정
  - ※ 3-3 공구에 성토된 흙을 재활용할 예정이었으나 관련 폐기물법 변경으로 성토된 흙을 처리를 못해 착공이 늦어짐
- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티(수자원공사)
  - 2구역(수변공원 1, 2호) : '25. 준공 예정
- 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2km) : 부산시(수자원공사, 부산도시공사)
  - 제2에코델타시티 : '24. GB해제 추진, '25. 착공, '28. 토지 분양
  - 서부산권 복합산업단지 : '24. 산업단지계획 승인, '25. 착공, '28. 준공 예정
- 6코스(김해교~대저수문, 6km)
  - 낙동강 친수공간 구상 마스터플랜 용역 결과에 따라 둘레길 조성 검토 : '24. 상반기

❖ 위치도




❖ 세부 위치도(3코스)





❖ 세부 위치도(5코스 제2에코델타시티)

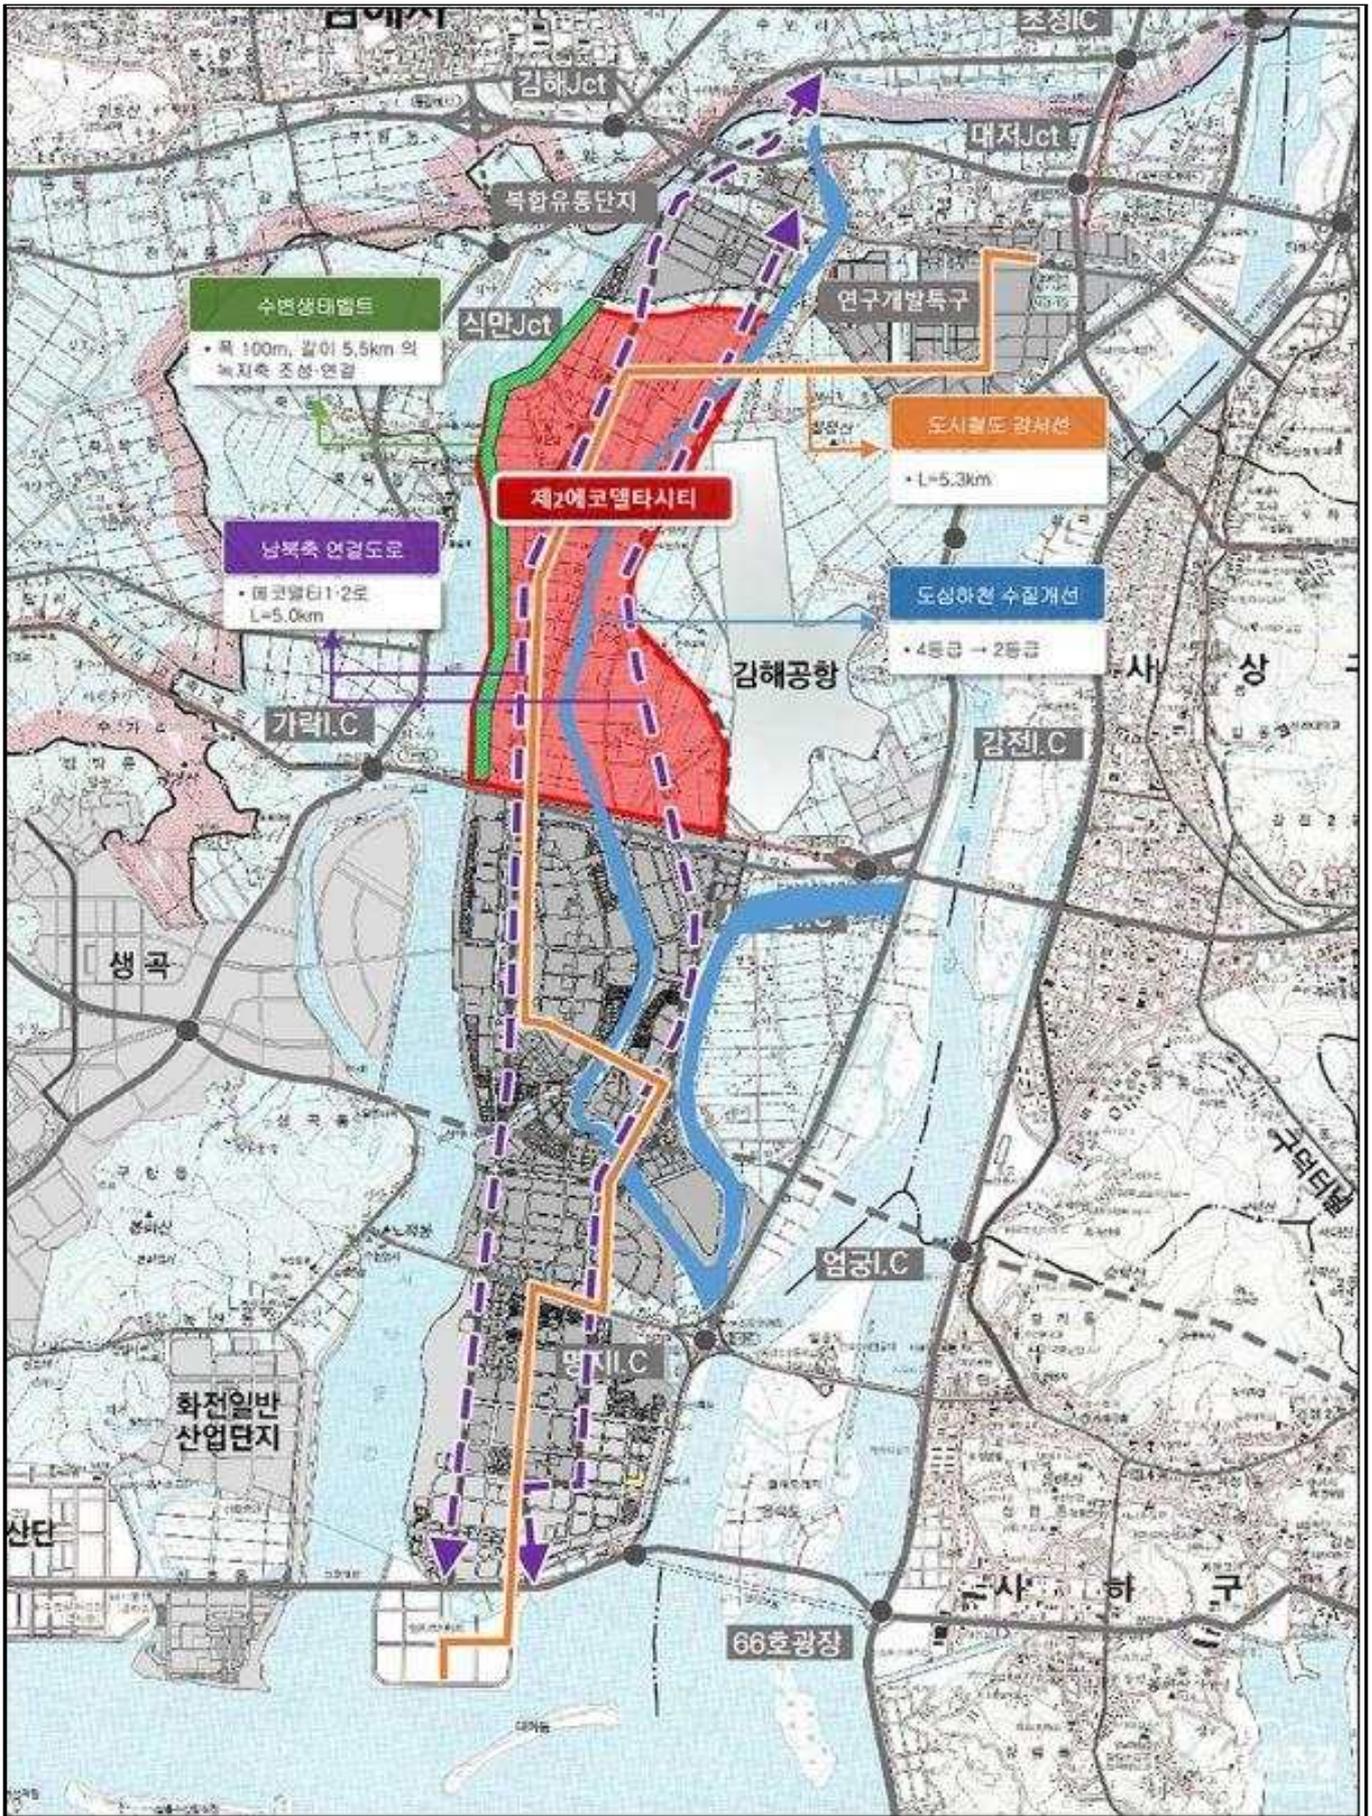

## ❖ 세부 위치도(5코스 서부산권 복합산업단지)

