#### [경제진흥과 경제유통계 ☎970-4472]

(단위: 백만원)

✔ 사업구분 자 체

✔ 예산구분 예 산

✔ 사업기간 단 기

✔ 신규여부 신 규

## ❖ 사업목표(추진방향)

#### 민관 협력으로 상권의 경영 여건을 개선하여 지속적인 상권 발전 도모

#### ❖ 사업개요

사업개요	행복마을 일원 환경 개선사업		
대상지역	명지2동 행복마을 일원		
사업내용	지역자원 연계 특화거리 조성을 위한 환경 개선사업 실시		
사 업 비	90.6백만원		
사업기간	2022. ~ 2024.		

❖ 확인지표: 기본 및 설계 용역, 조형물 제작·설치 진행, 인센티브 지급 등

# ❖ 재원조달 계획

구 분 계 2023년 2022년 2024년 계 90.6 90.6 국 비 71.6 71.6 시 비 구 비 19 19 기 타

## ❖ 세부 추진계획

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
지역자원 연계 특화거리 조성을 위한 환경 개선사업 실시	총 계	■ 행복마을 상권 활성화 도모	90.6	
	2022년	■ 상인들의 애로사항 및 건의사항 청취 등	-	
	2023년	■ 기본계획 수립 용역 추진, 특화거리 조성사업 실시	90.6	
	2024년	■ 교육 및 점포 컨설팅, 홍보 등 인센티브 지급	-	

(단위: 백만원)

### ❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년
상인들의 애로사항 및 건의사항 청취 등			
기본계획 수립 용역 및 특화거리 조성사업 추진 등			
교육 및 점포 컨설팅, 홍보 등 인센티브 지급			

### ❖ 추진실적

■ 2022. 3분기 : 현장방문을 통한 상인들의 애로사항 및 건의사항 청취

■ 2022. 4분기 : 상권 활성화 기본계획 수립 용역을 위한 사전 컨설팅 요청

■ 2023. 1분기 : 상권 활성화 기본계획 수립 용역 추진, 상인 간담회 실시

■ 2023. 2분기 : 입구사이니지, 스트리트퍼니처 제작·설치 계약(6. 12.)


상인 맞춤형 교육 개최(6. 28.~6. 29.) ▷소상공인시장진흥공단 주관

■ 2023. 3분기 : 행복마을입구 사이니지, 스트리트퍼니처 설치완료

## ❖ 향후 추진계획

- 분전함 커버 및 철조망 무너진 공터 가림막 설치(예정)
- 상인 대상 교육 개최 및 점포 컨설팅 실시, 홍보 등 인센티브 지급
- 2024년 행안부 공모사업 시행시 행복마을 상권활성화 연계사업 추진

# ❖ 위치도

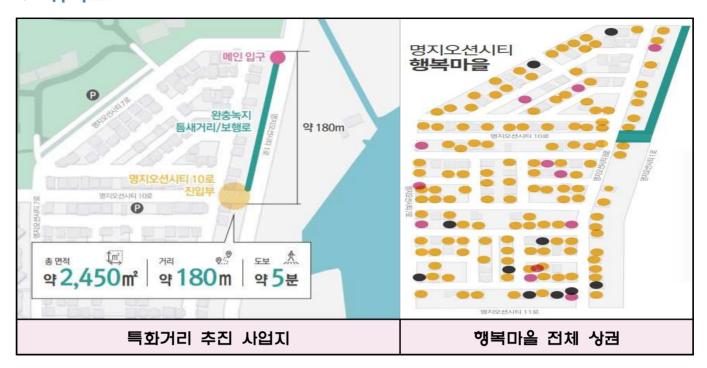

# ❖ 현장사진

